

MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL | NOTA DE EMPENHO N. 2.589/5

AV PRESIDENTE VARGAS 315 99.528.000 | TOMADA DE PRECOS
CNPJ-MF: 94 703 980/0001 32 TEL.: 5436152149 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: CIMA PROJETOS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP CNPJ-MF: 23 463 282/0001 69
ENDERECO: RUA REINALDO VALENTE, 187, SAL CIDADE: JACUTINGA RS 99.730.000
CODIGO.: 4.673/6 TELEFONE:

REQUISICAO | PROCES.:19/2021 | LICITACAO:001/2021 | TOMADA DE PRECOS

ORGAO: 04 SEC.OBRAS.SERV.URB.VIACAO E TRANSIT CpRV:
PROJETO/ATIVIDADE: 0403 26 782 0537 1039 MANUTENCAO/AMPLIACAO PRINCIP.VIAS
NATUREZA DESPESA: 4490 51 99 00 00 00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 25345/6
RECURSO: 1 RECURSO LIVRE Com.ReV: 0000 Sub.R 000

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
		EMPREITADA GLOBAL PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRA- VADOS DE CONCRETO EM TRECHOS DE RUAS DO MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL. CONTRATO 025/2021	532.575,5200	532.575,52
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			
<=>	<=>			

86.643,45

Liquido: 83.801,27

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 532.575,52

DESDOBRAMENTO:
CLASSIFICACAO: BASE LEGAL: 1-Lei 8.666/93
COMPR/CONVEN.: 25 /2021 | DESP.FUNC.: X-NSA (Nao se aplica)

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
12/04/2021	532.974,00	532.575,52	398,48

Declaro que recebi e conferi os mat./serv Em ____/____/____

Resp. da Contabil. Em 12 / 04 / 2021

R E C I B O
Recebi do MUNICIPIO SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
Em ____/____/____

RESP. LIQUIDACAO MILTON BEHREND

ORDENADOR DESPESA Atesto o pagamento deste documento
12 / 04 / 2021 09 / 07 / 21

ASSINATURA Doc:
Banco: _____
N. cheque: _____ N. conta: _____

VALDIR CHAPUIS VALQUIRIA SCHALLENBERG

Contabilidade

to

MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL

Av Presidente Vargas, n° 415, Coqueiros do Sul - RS CEP 99528-000



BOLETIM DE MEDIÇÃO

2


Contrato: 025/2021
Data do contrato: 05/05/2021 Período: 09/06/2021 a 07/07/2021
Ordem de serviço: 05/05/2021 Dias decorridos: 63 dias Situação: Normal
Valor do contrato: R\$ 532.575,52
Empresa: Cima Projetos e Construções Ltda

Item	Descrição	R\$	Medido no período	Material	MO	%
1.	Rua Levinus Lamb	R\$ 72.702,44	75%	R\$ 41.726,80	R\$ 12.800,03	13,65%
2.	Rua Felipe Wandscheer - A	R\$ 116.166,63	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	21,81%
3.	Rua Felipe Wandscheer - B	R\$ 128.466,48	25%	R\$ 24.615,35	R\$ 7.501,27	24,12%
4.	Rua Leopoldo Pilger	R\$ 118.879,96	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	22,32%
5.	Acesso a Piscina	R\$ 96.360,01	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18,09%
		R\$ 532.575,52	R\$ 86.643,45	R\$ 66.342,15	R\$ 20.301,30	16,27%

Observações: Pavimentação com pavimento intertravado em rua da Cidade de Coqueiros do Sul


Total no período: R\$ 86.643,45
Acumulado incluído período: R\$ 183.003,46
Variação no período: 47,35%
Executado: 34,36%

Coqueiros do Sul 07/07/2021


Cesar Dobler Fink
Eng. Civil e Seg do Trabalho

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

Obra: Observações: Pavimentação com pavimento intertravado em rua da Cidade de Coqueiros do Sul
Endereço: Ruas da Cidade

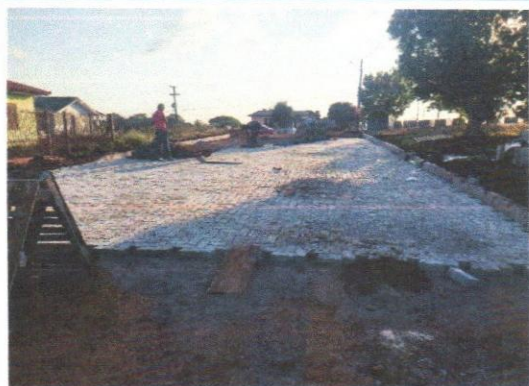

Coqueiros do Sul 09/06/2021

Cesar Dobler Fink

Eng. Civil e Seg do Trabalho



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
250

Data e Hora de Emissão
08/07/2021 13:31:16

Código de Verificação
8E4B.E288

Número da NFS-e Substituída



Competência
08/07/2021

Número do RPS / Série

Data de Emissão do RPS

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

Exigibilidade
Exigível

Município da Prestação do(s) Serviço(s)
Coqueiros do Sul/RS

Município da Incidência
Coqueiros do Sul/RS

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO

Nome/Razão Social
CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Nome Fantasia
CIMA CONSTRUÇÕES

Endereço
RUA REINALDO VALENTE, 187, SALA 02, CENTRO

Município do Prestador
Jacutinga/RS CEP 99730-000

Cpf/Cnpj
23.463.282/0001-69

Inscrição Municipal
3230

Inscrição Estadual
ISENTO

Telefone
5421068143

Email
construtoracima@gmail.com

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL

Endereço
AV PRESIDENTE VARGAS, 315, CENTRO

Município
Coqueiros do Sul/RS CEP 99528-000

Cpf/Cnpj
94.703.980/0001-32

Inscrição Municipal

Telefone
(54)36152149

Email

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO

Discriminação	Valor do Serviço	Descontos(R\$)	Alíquota	Valor do ISS(R\$)
Pavimentação com blocos intertravados em diversas ruas da cidade, TOMADA DE PREÇOS N. 01/2021- CONTRATO N.025 /2021 CNO Nº 90.006.79313/76 2ª medição-DEPOSITO: BANCO 041 - BANRISUL, AGENCIA N. 0341 - C/C N. 06.013761.0-0.	20.301,30		3,00	609,04

Valor do(s) Serviço(s)(R\$)	Valor Dedução(R\$)	Descontos Incondicionais(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	20.301,30
20.301,30				
Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Valor do ISS Retido(R\$)	Descontos Condicionais(R\$)	609,04
3,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

Imposto de Renda(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)
				2.233,14	

TOTAIS

Total do(s) Serviço(s)(R\$)	20.301,30	Total Líquido(R\$)	17.459,12
-----------------------------	------------------	--------------------	------------------

Código de Classificação de Serviços

07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇÕES

CEI da Obra: 900067931376

A Autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <http://portal.jacutinga.rs.gov.br:8080/sys552/>, menu Consulta de Autenticidade da NFS-e.

Data e Hora da Impressão: 08/07/2021 13:31:19

Recebemos de CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada ao lado. Emissão 08/07/2021 Tomador MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL Total Líquido : R\$ 17.459,12	NFS-e Nº 250
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL
DECLARAÇÃO

Declaro que conferi a(s) Ff(oi)s mercadori(a)s para o serviço(s) constantes nesta Nota Fiscal em pendência com o Município de Coqueiros do Sul _____

Nome: _____
Assinatura: _____

RECEBEMOS DE CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.385
		SÉRIE: 1

CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP RUA REINALDO VALENTE, 187 - SALA 02 - CENTRO, Jacutinga, RS - CEP: 99730000 - Fone/Fax: 54996853222	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.385 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4321 0723 4632 8200 0169 5500 1000 0003 8515 7600 0219 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210136699692 - 08/07/2021 13:45
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2010007500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 23.463.282/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE COQUEIROS DO SUL		CNPJ/CPF 94.703.980/0001-32	DATA DA EMISSÃO 08/07/2021
ENDEREÇO AV PRESIDENTE VARGAS, 315 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 99528-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Coqueiros do Sul	FONE/FAX 5436152149	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	66.342,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	66.342,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	MATERIAL	68010000	040	5102	UN	1,0000	66.342,1500	66.342,15					

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL
DECLARAÇÃO

Declaro que conferi e recebi(a)is mercadori(a)is e ou
serviço(s) constantes nesta Nota Fiscal em todas as condições
Coqueiros do Sul, _____ de 20
Nome: _____
Assinatura: _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EXECUÇÃO DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 - CON TRATO Nº 025/2021 - CNO Nº 90.006.79313/76 - 2º MEDIÇÃO. DE POSITO: BANCO 041 - BANRISUL, AGENCIA Nº 0341 - C/C Nº 06.0 13761.0-0. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO LUCRO PRESUMIDO EM 01/01/2020.	RESERVADO AO FISCO

DIÁRIO DE OBRAS		CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		DATA: 10/06/21	
		ENGENHEIRO: Rua Henrique Vitorino 181, sala 02 - Jacarepaguá/RJ CNPJ: 23.441.220/0001-69 TELEFONE: (21) 24603322 / (21) 50711448 E-MAIL: ccm@projetoconstrutor.com.br		NÚMERO DO DIÁRIO: Nº 1675	
OBRA: COQUELOS DO SUL - CT 95/11		DIAS TRABALHADOS		PRazo CONTRATUAL (DIAS)	
TEMPO		CLIMA/TEMPO		CONDIÇÃO	
Manhã:	Claro () Nublado () Chuvooso (X)	Praticável () Impraticável (X)			
Tarde:	Claro () Nublado () Chuvooso (X)	Praticável () Impraticável (X)			
Noite:	Claro () Nublado () Chuvooso ()	Praticável () Impraticável ()			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÃO DE OBRA			
LOCAÇÃO DE OBRA	() MONTAGEM DAS FORMAS ()	() CALCETEIRO ()			
TERRAPLANAGEM	() DOBRAGEM DAS FERRAGENS ()	() SERVENTE ()			
ESCAVAÇÃO DE VALAS	() CONCRETAGEM ()	() PEDREIRO ()			
ATERRO/ REATERRO	() LEVANT. DE PAREDES ()	() MESTRE DE OBRA ()			
ASSENTAMENTO DE TUBOS	() CHAPISCO/REBOCO ()				
CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	() PINTURA ()				
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	() TELHAMENTO ()	() EQUIPAMENTOS ()			
PAVIMENTAÇÃO	() INSTALAÇÕES HIDRAULICA ()	() RETRO ESCAVADEIRA ()			
COMPACTAÇÃO	() INSTALAÇÕES ELÉTRICA ()	() ESCAVADEIRA ()			
SINALIZAÇÃO	() ASSENTAMENTO DE PISOS ()	() MOTONIVELADORA ()			
	() ACABAMENTOS ()	() CAMINHÃO BASCULANTE ()			
		() ROLO COMPACTADOR ()			
		() PLACA COMPACTADORA ()			
OBSERVAÇÕES:					
Assinatura Contratado		Assinatura Fiscalização/Supervisão			

DIÁRIO DE OBRAS		CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		DATA: 11/06/21	
		ENGENHEIRO: Rua Henrique Vitorino 181, sala 02 - Jacarepaguá/RJ CNPJ: 23.441.220/0001-69 TELEFONE: (21) 24603322 / (21) 50711448 E-MAIL: ccm@projetoconstrutor.com.br		NÚMERO DO DIÁRIO: Nº 1677	
OBRA: COQUELOS DO SUL - CT 95/11		DIAS TRABALHADOS		PRazo CONTRATUAL (DIAS)	
TEMPO		CLIMA/TEMPO		CONDIÇÃO	
Manhã:	Claro () Nublado (X) Chuvooso ()	Praticável (X) Impraticável ()			
Tarde:	Claro () Nublado (X) Chuvooso ()	Praticável (X) Impraticável ()			
Noite:	Claro () Nublado () Chuvooso ()	Praticável () Impraticável ()			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÃO DE OBRA			
LOCAÇÃO DE OBRA	() MONTAGEM DAS FORMAS ()	() CALCETEIRO ()			
TERRAPLANAGEM	() DOBRAGEM DAS FERRAGENS ()	() SERVENTE ()			
ESCAVAÇÃO DE VALAS	() CONCRETAGEM ()	() PEDREIRO ()			
ATERRO/ REATERRO	() LEVANT. DE PAREDES ()	() MESTRE DE OBRA ()			
ASSENTAMENTO DE TUBOS	() CHAPISCO/REBOCO ()				
CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	() PINTURA ()				
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	(X) TELHAMENTO ()	() EQUIPAMENTOS ()			
PAVIMENTAÇÃO	() INSTALAÇÕES HIDRAULICA ()	() RETRO ESCAVADEIRA ()			
COMPACTAÇÃO	() INSTALAÇÕES ELÉTRICA ()	() ESCAVADEIRA ()			
SINALIZAÇÃO	() ASSENTAMENTO DE PISOS ()	() MOTONIVELADORA ()			
	() ACABAMENTOS ()	() CAMINHÃO BASCULANTE ()			
		() ROLO COMPACTADOR ()			
		() PLACA COMPACTADORA ()			
OBSERVAÇÕES: GARAGEM POSTO - TERRAPLANAGEM POR PARTE DA PREF RUA LEVINUS E MEIO FIO					
Assinatura Contratado		Assinatura Fiscalização/Supervisão			

DIÁRIO DE OBRAS		CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		DATA: 12/06/21	
		ENGENHEIRO: Rua Henrique Vitorino 181, sala 02 - Jacarepaguá/RJ CNPJ: 23.441.220/0001-69 TELEFONE: (21) 24603322 / (21) 50711448 E-MAIL: ccm@projetoconstrutor.com.br		NÚMERO DO DIÁRIO: Nº 1676	
OBRA: COQUELOS DO SUL - CT 95/11		DIAS TRABALHADOS		PRazo CONTRATUAL (DIAS)	
TEMPO		CLIMA/TEMPO		CONDIÇÃO	
Manhã:	Claro (X) Nublado () Chuvooso (X)	Praticável () Impraticável (X)			
Tarde:	Claro (X) Nublado () Chuvooso (X)	Praticável () Impraticável (X)			
Noite:	Claro () Nublado () Chuvooso ()	Praticável () Impraticável ()			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÃO DE OBRA			
LOCAÇÃO DE OBRA	() MONTAGEM DAS FORMAS ()	() CALCETEIRO ()			
TERRAPLANAGEM	() DOBRAGEM DAS FERRAGENS ()	() SERVENTE ()			
ESCAVAÇÃO DE VALAS	() CONCRETAGEM ()	() PEDREIRO ()			
ATERRO/ REATERRO	() LEVANT. DE PAREDES ()	() MESTRE DE OBRA ()			
ASSENTAMENTO DE TUBOS	() CHAPISCO/REBOCO ()				
CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	() PINTURA ()				
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	() TELHAMENTO ()	() EQUIPAMENTOS ()			
PAVIMENTAÇÃO	() INSTALAÇÕES HIDRAULICA ()	() RETRO ESCAVADEIRA ()			
COMPACTAÇÃO	() INSTALAÇÕES ELÉTRICA ()	() ESCAVADEIRA ()			
SINALIZAÇÃO	() ASSENTAMENTO DE PISOS ()	() MOTONIVELADORA ()			
	() ACABAMENTOS ()	() CAMINHÃO BASCULANTE ()			
		() ROLO COMPACTADOR ()			
		() PLACA COMPACTADORA ()			
OBSERVAÇÕES:					
Assinatura Contratado		Assinatura Fiscalização/Supervisão			

DIÁRIO DE OBRAS		CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		DATA: 15/06/21	
		ENGENHEIRO: Rua Henrique Vitorino 181, sala 02 - Jacarepaguá/RJ CNPJ: 23.441.220/0001-69 TELEFONE: (21) 24603322 / (21) 50711448 E-MAIL: ccm@projetoconstrutor.com.br		NÚMERO DO DIÁRIO: Nº 1678	
OBRA: COQUELOS DO SUL - CT 95/11		DIAS TRABALHADOS		PRazo CONTRATUAL (DIAS)	
TEMPO		CLIMA/TEMPO		CONDIÇÃO	
Manhã:	Claro (X) Nublado () Chuvooso ()	Praticável (X) Impraticável ()			
Tarde:	Claro (X) Nublado () Chuvooso ()	Praticável (X) Impraticável ()			
Noite:	Claro () Nublado () Chuvooso ()	Praticável () Impraticável ()			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÃO DE OBRA			
LOCAÇÃO DE OBRA	() MONTAGEM DAS FORMAS ()	() CALCETEIRO ()			
TERRAPLANAGEM	() DOBRAGEM DAS FERRAGENS ()	() SERVENTE ()			
ESCAVAÇÃO DE VALAS	() CONCRETAGEM ()	() PEDREIRO ()			
ATERRO/ REATERRO	() LEVANT. DE PAREDES ()	() MESTRE DE OBRA ()			
ASSENTAMENTO DE TUBOS	() CHAPISCO/REBOCO ()				
CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	() PINTURA ()				
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	(X) TELHAMENTO ()	() EQUIPAMENTOS ()			
PAVIMENTAÇÃO	(X) INSTALAÇÕES HIDRAULICA ()	() RETRO ESCAVADEIRA ()			
COMPACTAÇÃO	() INSTALAÇÕES ELÉTRICA ()	() ESCAVADEIRA ()			
SINALIZAÇÃO	() ASSENTAMENTO DE PISOS ()	() MOTONIVELADORA ()			
	() ACABAMENTOS ()	() CAMINHÃO BASCULANTE ()			
		() ROLO COMPACTADOR ()			
		() PLACA COMPACTADORA ()			
OBSERVAÇÕES: RUA LEVINUS E GARAGEM POSTO					
Assinatura Contratado		Assinatura Fiscalização/Supervisão			

DIÁRIO DE OBRAS				
GCIMA CONSTRUTORA		CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ENDEREÇO: Rua Haroldo Valente 185, sala 02 - Itaquajuru CEP: 23.132-000 CNPJ: 23.467.232/0001-00 TELEFONE: (24) 34653222 / (24) 34711188 E-MAIL: cpm@gcima.com.br		DATA: 16/06/21
OBRA: COQUELOS DO SUL - ET 25/11		NÚMERO DO DIÁRIO: Nº 1679		DIAS TRABALHADOS PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
CLIMA/TEMPO				
TEMPO		CONDIÇÃO		
Manhã:	Claro ()	Nublado (X)	Chuvoso (X)	Praticável (X) / Impraticável ()
Tarde:	Claro ()	Nublado ()	Chuvoso ()	Praticável (X) / Impraticável ()
Noite:	Claro ()	Nublado ()	Chuvoso ()	Praticável () / Impraticável ()
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÃO DE OBRA		
LOCAÇÃO DE OBRA	() MONTAGEM DAS FORMAS	()	CALCETEIRO	()
TERRAPLANAGEM	() DOBRAGEM DAS FERRAGENS	()	SERVEINTE	()
ESCAVAÇÃO DE VALAS	() CONCRETAGEM	()	PEDREIRO	()
ATERRO/ REATERRO	() LEVANT. DE PAREDES	()	MESTRE DE OBRA	()
ASSENTAMENTO DE TUBOS	() CHAPISCO/REBOCO	()		()
CONFEÇÃO CAIXAS PLUV.	() PINTURA	()		()
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	() TELHAMENTO	()	EQUIPAMENTOS	()
PAVIMENTAÇÃO	(X) INSTALAÇÕES HIDRAULICA	()	RETRO ESCAVADEIRA	()
COMPACTAÇÃO	() INSTALAÇÕES ELÉTRICA	()	ESCAVADEIRA	()
SINALIZAÇÃO	() ASSENTAMENTO DE PISOS	()	MOTONIVELADORA	()
	() ACABAMENTOS	()	CAMINHÃO BASCULANTE	()
	()	()	ROLO COMPACTADOR	()
	()	()	PLACA COMPACTADORA	()
	()	()		()
OBSERVAÇÕES:	EXECUÇÃO BALANÇO POSTO			
Assinatura Contratado	Assinatura Fiscalização/Supervisão			

DIÁRIO DE OBRAS				
GCIMA CONSTRUTORA		CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ENDEREÇO: Rua Haroldo Valente 185, sala 02 - Itaquajuru CEP: 23.132-000 CNPJ: 23.467.232/0001-00 TELEFONE: (24) 34653222 / (24) 34711188 E-MAIL: cpm@gcima.com.br		DATA: 8/06/21
OBRA: COQUELOS DO SUL - ET 25/11		NÚMERO DO DIÁRIO: Nº 1681		DIAS TRABALHADOS PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
CLIMA/TEMPO				
TEMPO		CONDIÇÃO		
Manhã:	Claro ()	Nublado ()	Chuvoso (X)	Praticável () / Impraticável (X)
Tarde:	Claro ()	Nublado ()	Chuvoso (X)	Praticável () / Impraticável (X)
Noite:	Claro ()	Nublado ()	Chuvoso ()	Praticável () / Impraticável ()
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÃO DE OBRA		
LOCAÇÃO DE OBRA	() MONTAGEM DAS FORMAS	()	CALCETEIRO	()
TERRAPLANAGEM	() DOBRAGEM DAS FERRAGENS	()	SERVEINTE	()
ESCAVAÇÃO DE VALAS	() CONCRETAGEM	()	PEDREIRO	()
ATERRO/ REATERRO	() LEVANT. DE PAREDES	()	MESTRE DE OBRA	()
ASSENTAMENTO DE TUBOS	() CHAPISCO/REBOCO	()		()
CONFEÇÃO CAIXAS PLUV.	() PINTURA	()		()
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	() TELHAMENTO	()	EQUIPAMENTOS	()
PAVIMENTAÇÃO	() INSTALAÇÕES HIDRAULICA	()	RETRO ESCAVADEIRA	()
COMPACTAÇÃO	() INSTALAÇÕES ELÉTRICA	()	ESCAVADEIRA	()
SINALIZAÇÃO	() ASSENTAMENTO DE PISOS	()	MOTONIVELADORA	()
	() ACABAMENTOS	()	CAMINHÃO BASCULANTE	()
	()	()	ROLO COMPACTADOR	()
	()	()	PLACA COMPACTADORA	()
	()	()		()
OBSERVAÇÕES:				
Assinatura Contratado	Assinatura Fiscalização/Supervisão			

DIÁRIO DE OBRAS				
GCIMA CONSTRUTORA		CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ENDEREÇO: Rua Haroldo Valente 185, sala 02 - Itaquajuru CEP: 23.132-000 CNPJ: 23.467.232/0001-00 TELEFONE: (24) 34653222 / (24) 34711188 E-MAIL: cpm@gcima.com.br		DATA: 12/06/21
OBRA: COQUELOS DO SUL - ET 25/11		NÚMERO DO DIÁRIO: Nº 1680		DIAS TRABALHADOS PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
CLIMA/TEMPO				
TEMPO		CONDIÇÃO		
Manhã:	Claro ()	Nublado ()	Chuvoso (X)	Praticável () / Impraticável (X)
Tarde:	Claro ()	Nublado ()	Chuvoso (X)	Praticável () / Impraticável (X)
Noite:	Claro ()	Nublado ()	Chuvoso ()	Praticável () / Impraticável ()
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÃO DE OBRA		
LOCAÇÃO DE OBRA	() MONTAGEM DAS FORMAS	()	CALCETEIRO	()
TERRAPLANAGEM	() DOBRAGEM DAS FERRAGENS	()	SERVEINTE	()
ESCAVAÇÃO DE VALAS	() CONCRETAGEM	()	PEDREIRO	()
ATERRO/ REATERRO	() LEVANT. DE PAREDES	()	MESTRE DE OBRA	()
ASSENTAMENTO DE TUBOS	() CHAPISCO/REBOCO	()		()
CONFEÇÃO CAIXAS PLUV.	() PINTURA	()		()
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	() TELHAMENTO	()	EQUIPAMENTOS	()
PAVIMENTAÇÃO	() INSTALAÇÕES HIDRAULICA	()	RETRO ESCAVADEIRA	()
COMPACTAÇÃO	() INSTALAÇÕES ELÉTRICA	()	ESCAVADEIRA	()
SINALIZAÇÃO	() ASSENTAMENTO DE PISOS	()	MOTONIVELADORA	()
	() ACABAMENTOS	()	CAMINHÃO BASCULANTE	()
	()	()	ROLO COMPACTADOR	()
	()	()	PLACA COMPACTADORA	()
	()	()		()
OBSERVAÇÕES:				
Assinatura Contratado	Assinatura Fiscalização/Supervisão			

DIÁRIO DE OBRAS				
GCIMA CONSTRUTORA		CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ENDEREÇO: Rua Haroldo Valente 185, sala 02 - Itaquajuru CEP: 23.132-000 CNPJ: 23.467.232/0001-00 TELEFONE: (24) 34653222 / (24) 34711188 E-MAIL: cpm@gcima.com.br		DATA: 9/06/21
OBRA: COQUELOS DO SUL - ET 25/11		NÚMERO DO DIÁRIO: Nº 1682		DIAS TRABALHADOS PRAZO CONTRATUAL (DIAS)
CLIMA/TEMPO				
TEMPO		CONDIÇÃO		
Manhã:	Claro ()	Nublado ()	Chuvoso (X)	Praticável () / Impraticável (X)
Tarde:	Claro ()	Nublado ()	Chuvoso (X)	Praticável () / Impraticável (X)
Noite:	Claro ()	Nublado ()	Chuvoso ()	Praticável () / Impraticável ()
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÃO DE OBRA		
LOCAÇÃO DE OBRA	() MONTAGEM DAS FORMAS	()	CALCETEIRO	()
TERRAPLANAGEM	() DOBRAGEM DAS FERRAGENS	()	SERVEINTE	()
ESCAVAÇÃO DE VALAS	() CONCRETAGEM	()	PEDREIRO	()
ATERRO/ REATERRO	() LEVANT. DE PAREDES	()	MESTRE DE OBRA	()
ASSENTAMENTO DE TUBOS	() CHAPISCO/REBOCO	()		()
CONFEÇÃO CAIXAS PLUV.	() PINTURA	()		()
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	() TELHAMENTO	()	EQUIPAMENTOS	()
PAVIMENTAÇÃO	() INSTALAÇÕES HIDRAULICA	()	RETRO ESCAVADEIRA	()
COMPACTAÇÃO	() INSTALAÇÕES ELÉTRICA	()	ESCAVADEIRA	()
SINALIZAÇÃO	() ASSENTAMENTO DE PISOS	()	MOTONIVELADORA	()
	() ACABAMENTOS	()	CAMINHÃO BASCULANTE	()
	()	()	ROLO COMPACTADOR	()
	()	()	PLACA COMPACTADORA	()
	()	()		()
OBSERVAÇÕES:				
Assinatura Contratado	Assinatura Fiscalização/Supervisão			

DIÁRIO DE OBRAS		DATA: 17/06/21	
SCIMA CONSTRUTORA	CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ENDEDEDO, Rua Fernando Vilela 187, sala 02 - Jacupiranga CEP: 91.250-001 CNPJ: 21.493.760/0001-69 TELEFONE: (51) 35551-222 - (51) 9.9711-152 E-MAIL: cpm@scima.com.br	NUMERO DO DIÁRIO	Nº 1683
		DIAS TRABALHADOS PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	
OBRA: COQUEIROS DO SUL - CT 15/21			
CLIMA/TEMPO		CONDICÃO	
Manhã:	Claro () Nublado (X) Chuvoso ()	Praticavel () Inpraticavel (X)	
Tarde:	Claro () Nublado (X) Chuvoso ()	Praticavel () Inpraticavel (X)	
Noite:	Claro () Nublado () Chuvoso ()	Praticavel () Inpraticavel ()	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÃO DE OBRA	
LOCAÇÃO DE OBRA	() MONTAGEM DAS FORMAS ()	CALCETEIRO	()
TERRAPLANAGEM	() DOBRAGEM DAS FERRAGENS ()	SERVEnte	()
ESCAVAÇÃO DE VALAS	() CONCRETAGEM ()	PEDREIRO	()
ATERRO/ REATERRO	() LEVANT. DE PAREDES ()	MESTRE DE OBRA	()
ASSENTAMENTO DE TUBOS	() CHAPISCO/REBOCO ()		()
CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	() PINTURA ()		()
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	() TELHAMENTO ()	EQUIPAMENTOS	()
PAVIMENTAÇÃO	() INSTALAÇÕES HIDRAULICA ()	RETRO ESCAVADEIRA	()
COMPACTAÇÃO	() INSTALAÇÕES ELETRICA ()	ESCAVADEIRA	()
SINALIZAÇÃO	() ASSENTAMENTO DE PISOS ()	MOTONIVELADORA	()
	() ACABAMENTOS ()	CAMINHÃO BASCULANTE	()
	()	ROLO COMPACTADOR	()
	()	PLACA COMPACTADORA	()
OBSERVAÇÕES:			
Assinatura Contratado		Assinatura Fiscalização/Supervisão	

DIÁRIO DE OBRAS		DATA: 18/06/21	
SCIMA CONSTRUTORA	CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ENDEDEDO, Rua Fernando Vilela 187, sala 02 - Jacupiranga CEP: 91.250-001 CNPJ: 21.493.760/0001-69 TELEFONE: (51) 35551-222 - (51) 9.9711-152 E-MAIL: cpm@scima.com.br	NUMERO DO DIÁRIO	Nº 1685
		DIAS TRABALHADOS PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	
OBRA: COQUEIROS DO SUL - CT 15/21			
CLIMA/TEMPO		CONDICÃO	
Manhã:	Claro () Nublado (X) Chuvoso ()	Praticavel () Inpraticavel (X)	
Tarde:	Claro () Nublado (X) Chuvoso ()	Praticavel () Inpraticavel (X)	
Noite:	Claro () Nublado () Chuvoso ()	Praticavel () Inpraticavel ()	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÃO DE OBRA	
LOCAÇÃO DE OBRA	() MONTAGEM DAS FORMAS ()	CALCETEIRO	()
TERRAPLANAGEM	() DOBRAGEM DAS FERRAGENS ()	SERVEnte	()
ESCAVAÇÃO DE VALAS	() CONCRETAGEM ()	PEDREIRO	()
ATERRO/ REATERRO	() LEVANT. DE PAREDES ()	MESTRE DE OBRA	()
ASSENTAMENTO DE TUBOS	() CHAPISCO/REBOCO ()		()
CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	() PINTURA ()		()
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	() TELHAMENTO ()	EQUIPAMENTOS	()
PAVIMENTAÇÃO	() INSTALAÇÕES HIDRAULICA ()	RETRO ESCAVADEIRA	()
COMPACTAÇÃO	() INSTALAÇÕES ELETRICA ()	ESCAVADEIRA	()
SINALIZAÇÃO	() ASSENTAMENTO DE PISOS ()	MOTONIVELADORA	()
	() ACABAMENTOS ()	CAMINHÃO BASCULANTE	()
	()	ROLO COMPACTADOR	()
	()	PLACA COMPACTADORA	()
OBSERVAÇÕES:			
Assinatura Contratado		Assinatura Fiscalização/Supervisão	

DIÁRIO DE OBRAS		DATA: 19/06/21	
SCIMA CONSTRUTORA	CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ENDEDEDO, Rua Fernando Vilela 187, sala 02 - Jacupiranga CEP: 91.250-001 CNPJ: 21.493.760/0001-69 TELEFONE: (51) 35551-222 - (51) 9.9711-152 E-MAIL: cpm@scima.com.br	NUMERO DO DIÁRIO	Nº 1684
		DIAS TRABALHADOS PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	
OBRA: COQUEIROS DO SUL - CT 15/21			
CLIMA/TEMPO		CONDICÃO	
Manhã:	Claro (X) Nublado () Chuvoso ()	Praticavel () Inpraticavel (X)	
Tarde:	Claro () Nublado () Chuvoso ()	Praticavel () Inpraticavel ()	
Noite:	Claro () Nublado () Chuvoso ()	Praticavel () Inpraticavel ()	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÃO DE OBRA	
LOCAÇÃO DE OBRA	() MONTAGEM DAS FORMAS ()	CALCETEIRO	()
TERRAPLANAGEM	() DOBRAGEM DAS FERRAGENS ()	SERVEnte	()
ESCAVAÇÃO DE VALAS	() CONCRETAGEM ()	PEDREIRO	()
ATERRO/ REATERRO	() LEVANT. DE PAREDES ()	MESTRE DE OBRA	()
ASSENTAMENTO DE TUBOS	() CHAPISCO/REBOCO ()		()
CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	() PINTURA ()		()
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	() TELHAMENTO ()	EQUIPAMENTOS	()
PAVIMENTAÇÃO	() INSTALAÇÕES HIDRAULICA ()	RETRO ESCAVADEIRA	()
COMPACTAÇÃO	() INSTALAÇÕES ELETRICA ()	ESCAVADEIRA	()
SINALIZAÇÃO	() ASSENTAMENTO DE PISOS ()	MOTONIVELADORA	()
	() ACABAMENTOS ()	CAMINHÃO BASCULANTE	()
	()	ROLO COMPACTADOR	()
	()	PLACA COMPACTADORA	()
OBSERVAÇÕES:			
Assinatura Contratado		Assinatura Fiscalização/Supervisão	

DIÁRIO DE OBRAS		DATA: 25/06/21	
SCIMA CONSTRUTORA	CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ENDEDEDO, Rua Fernando Vilela 187, sala 02 - Jacupiranga CEP: 91.250-001 CNPJ: 21.493.760/0001-69 TELEFONE: (51) 35551-222 - (51) 9.9711-152 E-MAIL: cpm@scima.com.br	NUMERO DO DIÁRIO	Nº 1686
		DIAS TRABALHADOS PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	
OBRA: COQUEIROS DO SUL - CT 15/21			
CLIMA/TEMPO		CONDICÃO	
Manhã:	Claro () Nublado () Chuvoso (X)	Praticavel () Inpraticavel (X)	
Tarde:	Claro () Nublado () Chuvoso (X)	Praticavel () Inpraticavel (X)	
Noite:	Claro () Nublado () Chuvoso ()	Praticavel () Inpraticavel ()	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÃO DE OBRA	
LOCAÇÃO DE OBRA	() MONTAGEM DAS FORMAS ()	CALCETEIRO	()
TERRAPLANAGEM	() DOBRAGEM DAS FERRAGENS ()	SERVEnte	()
ESCAVAÇÃO DE VALAS	() CONCRETAGEM ()	PEDREIRO	()
ATERRO/ REATERRO	() LEVANT. DE PAREDES ()	MESTRE DE OBRA	()
ASSENTAMENTO DE TUBOS	() CHAPISCO/REBOCO ()		()
CONFECÇÃO CAIXAS PLUV.	() PINTURA ()		()
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	() TELHAMENTO ()	EQUIPAMENTOS	()
PAVIMENTAÇÃO	() INSTALAÇÕES HIDRAULICA ()	RETRO ESCAVADEIRA	()
COMPACTAÇÃO	() INSTALAÇÕES ELETRICA ()	ESCAVADEIRA	()
SINALIZAÇÃO	() ASSENTAMENTO DE PISOS ()	MOTONIVELADORA	()
	() ACABAMENTOS ()	CAMINHÃO BASCULANTE	()
	()	ROLO COMPACTADOR	()
	()	PLACA COMPACTADORA	()
OBSERVAÇÕES:			
Assinatura Contratado		Assinatura Fiscalização/Supervisão	

DIÁRIO DE OBRAS		DATA: 07/07/21	
CIMA CONSTRUTORA	CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ENDEREÇO: Rua Leopoldo Schmidt 187, sala 02 - Joinville/SC CEP: 89.100-000 CNPJ: 23.468.245/0001-66 TELEFONE: (51) 33653322 / (51) 33711148 E-MAIL: construtora@cima.com.br	NUMERO DO DIÁRIO	Nº 1687
		DIAS TRABALHADOS PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	
OBRA: COQUEIROS DO SUL - CT 05/91			
TEMPO		CONDIÇÃO	
Manhã:	Claro <input checked="" type="checkbox"/> Nublado <input checked="" type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/>	Praticável <input type="checkbox"/> Impraticável <input checked="" type="checkbox"/>	
Tarde:	Claro <input checked="" type="checkbox"/> Nublado <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/>	Praticável <input checked="" type="checkbox"/> Impraticável <input type="checkbox"/>	
Noite:	Claro <input type="checkbox"/> Nublado <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/>	Praticável <input type="checkbox"/> Impraticável <input type="checkbox"/>	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÃO DE OBRA	
LOCAÇÃO DE OBRA	<input type="checkbox"/> MONTAGEM DAS FORMAS	<input type="checkbox"/> CALCETEIRO	<input type="checkbox"/>
TERRAPLANAGEM	<input type="checkbox"/> DOBRAGEM DAS FERRAGENS	<input type="checkbox"/> SERVENTE	<input type="checkbox"/>
ESCAVAÇÃO DE VALAS	<input type="checkbox"/> CONCRETAGEM	<input type="checkbox"/> PEDREIRO	<input type="checkbox"/>
ATERRO/ REATERRO	<input type="checkbox"/> LEVANT. DE PAREDES	<input type="checkbox"/> MESTRE DE OBRA	<input type="checkbox"/>
ASSENTAMENTO DE TUBOS	<input type="checkbox"/> CHAPISCO/REBOCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONFEÇÃO CAIXAS PLUV.	<input type="checkbox"/> PINTURA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	<input type="checkbox"/> TELHAMENTO	<input type="checkbox"/> EQUIPAMENTOS	<input type="checkbox"/>
PAVIMENTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> INSTALAÇÕES HIDRAULICA	<input type="checkbox"/> RETRO ESCAVADEIRA	<input type="checkbox"/>
COMPACTAÇÃO	<input type="checkbox"/> INSTALAÇÕES ELÉTRICA	<input type="checkbox"/> ESCAVADEIRA	<input type="checkbox"/>
SINALIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> ASSENTAMENTO DE PISOS	<input type="checkbox"/> MOTONIVELADORA	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> ACABAMENTOS	<input type="checkbox"/> CAMINHÃO BASCULANTE	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ROLO COMPACTADOR	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> PLACA COMPACTADORA	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OBSERVAÇÕES: CANCELAR FOM: TERMINO DA PAVIMENTAÇÃO RUA LEVINUS: PAVIMENTAÇÃO			
Assinatura Contratado	Assinatura Fiscalização/Supervisão		

DIÁRIO DE OBRAS		DATA: 08/07/21	
CIMA CONSTRUTORA	CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ENDEREÇO: Rua Leopoldo Schmidt 187, sala 02 - Joinville/SC CEP: 89.100-000 CNPJ: 23.468.245/0001-66 TELEFONE: (51) 33653322 / (51) 33711148 E-MAIL: construtora@cima.com.br	NUMERO DO DIÁRIO	Nº 1689
		DIAS TRABALHADOS PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	
OBRA: COQUEIROS DO SUL - CT 05/91			
TEMPO		CONDIÇÃO	
Manhã:	Claro <input checked="" type="checkbox"/> Nublado <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/>	Praticável <input checked="" type="checkbox"/> Impraticável <input type="checkbox"/>	
Tarde:	Claro <input checked="" type="checkbox"/> Nublado <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/>	Praticável <input checked="" type="checkbox"/> Impraticável <input type="checkbox"/>	
Noite:	Claro <input type="checkbox"/> Nublado <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/>	Praticável <input type="checkbox"/> Impraticável <input type="checkbox"/>	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÃO DE OBRA	
LOCAÇÃO DE OBRA	<input type="checkbox"/> MONTAGEM DAS FORMAS	<input type="checkbox"/> CALCETEIRO	<input type="checkbox"/>
TERRAPLANAGEM	<input type="checkbox"/> DOBRAGEM DAS FERRAGENS	<input type="checkbox"/> SERVENTE	<input type="checkbox"/>
ESCAVAÇÃO DE VALAS	<input type="checkbox"/> CONCRETAGEM	<input type="checkbox"/> PEDREIRO	<input type="checkbox"/>
ATERRO/ REATERRO	<input type="checkbox"/> LEVANT. DE PAREDES	<input type="checkbox"/> MESTRE DE OBRA	<input type="checkbox"/>
ASSENTAMENTO DE TUBOS	<input type="checkbox"/> CHAPISCO/REBOCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONFEÇÃO CAIXAS PLUV.	<input type="checkbox"/> PINTURA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	<input type="checkbox"/> TELHAMENTO	<input type="checkbox"/> EQUIPAMENTOS	<input type="checkbox"/>
PAVIMENTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> INSTALAÇÕES HIDRAULICA	<input type="checkbox"/> RETRO ESCAVADEIRA	<input type="checkbox"/>
COMPACTAÇÃO	<input type="checkbox"/> INSTALAÇÕES ELÉTRICA	<input type="checkbox"/> ESCAVADEIRA	<input type="checkbox"/>
SINALIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> ASSENTAMENTO DE PISOS	<input type="checkbox"/> MOTONIVELADORA	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> ACABAMENTOS	<input type="checkbox"/> CAMINHÃO BASCULANTE	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ROLO COMPACTADOR	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> PLACA COMPACTADORA	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OBSERVAÇÕES: RUA LEVINUS: EM EXECUÇÃO FALTANDO POUCOS METROS A RUA FELICE WANDSCHEK FAZ TERRAPLANAGEM E TERMINO DA BARRAGEM PARA INICIAR O CIMENTAMENTO - TRABALHADORES FORAM ISOLADOS COM PLASTICO VERDE			
Assinatura Contratado	Assinatura Fiscalização/Supervisão		

DIÁRIO DE OBRAS		DATA: 09/07/21	
CIMA CONSTRUTORA	CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ENDEREÇO: Rua Leopoldo Schmidt 187, sala 02 - Joinville/SC CEP: 89.100-000 CNPJ: 23.468.245/0001-66 TELEFONE: (51) 33653322 / (51) 33711148 E-MAIL: construtora@cima.com.br	NUMERO DO DIÁRIO	Nº 1688
		DIAS TRABALHADOS PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	
OBRA: COQUEIROS DO SUL - CT 05/91			
TEMPO		CONDIÇÃO	
Manhã:	Claro <input checked="" type="checkbox"/> Nublado <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/>	Praticável <input checked="" type="checkbox"/> Impraticável <input type="checkbox"/>	
Tarde:	Claro <input checked="" type="checkbox"/> Nublado <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/>	Praticável <input checked="" type="checkbox"/> Impraticável <input type="checkbox"/>	
Noite:	Claro <input type="checkbox"/> Nublado <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/>	Praticável <input type="checkbox"/> Impraticável <input type="checkbox"/>	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÃO DE OBRA	
LOCAÇÃO DE OBRA	<input type="checkbox"/> MONTAGEM DAS FORMAS	<input type="checkbox"/> CALCETEIRO	<input type="checkbox"/>
TERRAPLANAGEM	<input type="checkbox"/> DOBRAGEM DAS FERRAGENS	<input type="checkbox"/> SERVENTE	<input type="checkbox"/>
ESCAVAÇÃO DE VALAS	<input type="checkbox"/> CONCRETAGEM	<input type="checkbox"/> PEDREIRO	<input type="checkbox"/>
ATERRO/ REATERRO	<input type="checkbox"/> LEVANT. DE PAREDES	<input type="checkbox"/> MESTRE DE OBRA	<input type="checkbox"/>
ASSENTAMENTO DE TUBOS	<input type="checkbox"/> CHAPISCO/REBOCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONFEÇÃO CAIXAS PLUV.	<input type="checkbox"/> PINTURA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	<input type="checkbox"/> TELHAMENTO	<input type="checkbox"/> EQUIPAMENTOS	<input type="checkbox"/>
PAVIMENTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> INSTALAÇÕES HIDRAULICA	<input type="checkbox"/> RETRO ESCAVADEIRA	<input type="checkbox"/>
COMPACTAÇÃO	<input type="checkbox"/> INSTALAÇÕES ELÉTRICA	<input type="checkbox"/> ESCAVADEIRA	<input type="checkbox"/>
SINALIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> ASSENTAMENTO DE PISOS	<input type="checkbox"/> MOTONIVELADORA	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> ACABAMENTOS	<input type="checkbox"/> CAMINHÃO BASCULANTE	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ROLO COMPACTADOR	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> PLACA COMPACTADORA	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OBSERVAÇÕES: RUA LEVINUS: EM EXECUÇÃO			
Assinatura Contratado	Assinatura Fiscalização/Supervisão		

DIÁRIO DE OBRAS		DATA: 10/07/21	
CIMA CONSTRUTORA	CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ENDEREÇO: Rua Leopoldo Schmidt 187, sala 02 - Joinville/SC CEP: 89.100-000 CNPJ: 23.468.245/0001-66 TELEFONE: (51) 33653322 / (51) 33711148 E-MAIL: construtora@cima.com.br	NUMERO DO DIÁRIO	Nº 1690
		DIAS TRABALHADOS PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	
OBRA: COQUEIROS DO SUL - CT 05/91			
TEMPO		CONDIÇÃO	
Manhã:	Claro <input checked="" type="checkbox"/> Nublado <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/>	Praticável <input checked="" type="checkbox"/> Impraticável <input type="checkbox"/>	
Tarde:	Claro <input checked="" type="checkbox"/> Nublado <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/>	Praticável <input checked="" type="checkbox"/> Impraticável <input type="checkbox"/>	
Noite:	Claro <input type="checkbox"/> Nublado <input type="checkbox"/> Chuvoso <input type="checkbox"/>	Praticável <input type="checkbox"/> Impraticável <input type="checkbox"/>	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÃO DE OBRA	
LOCAÇÃO DE OBRA	<input type="checkbox"/> MONTAGEM DAS FORMAS	<input type="checkbox"/> CALCETEIRO	<input type="checkbox"/>
TERRAPLANAGEM	<input type="checkbox"/> DOBRAGEM DAS FERRAGENS	<input type="checkbox"/> SERVENTE	<input type="checkbox"/>
ESCAVAÇÃO DE VALAS	<input type="checkbox"/> CONCRETAGEM	<input type="checkbox"/> PEDREIRO	<input type="checkbox"/>
ATERRO/ REATERRO	<input type="checkbox"/> LEVANT. DE PAREDES	<input type="checkbox"/> MESTRE DE OBRA	<input type="checkbox"/>
ASSENTAMENTO DE TUBOS	<input type="checkbox"/> CHAPISCO/REBOCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONFEÇÃO CAIXAS PLUV.	<input type="checkbox"/> PINTURA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	<input type="checkbox"/> TELHAMENTO	<input type="checkbox"/> EQUIPAMENTOS	<input type="checkbox"/>
PAVIMENTAÇÃO	<input type="checkbox"/> INSTALAÇÕES HIDRAULICA	<input type="checkbox"/> RETRO ESCAVADEIRA	<input type="checkbox"/>
COMPACTAÇÃO	<input type="checkbox"/> INSTALAÇÕES ELÉTRICA	<input type="checkbox"/> ESCAVADEIRA	<input type="checkbox"/>
SINALIZAÇÃO	<input type="checkbox"/> ASSENTAMENTO DE PISOS	<input type="checkbox"/> MOTONIVELADORA	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> ACABAMENTOS	<input type="checkbox"/> CAMINHÃO BASCULANTE	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ROLO COMPACTADOR	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> PLACA COMPACTADORA	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OBSERVAÇÕES: FUNCIONARIOS EM ISOLAMENTO			
Assinatura Contratado	Assinatura Fiscalização/Supervisão		

DIÁRIO DE OBRAS



CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ENDRESCO, Rua Príncipe Valente 187, sala 102 - Jaraguá/RS
 CEP: 91420-000
 CNPJ: 09.612.227/0001-42
 TELEFONE: (51) 33681222 - (54) 99711463
 E-MAIL: cima@cimaeng.com.br

DATA: 09/06/20

NUMERO DO DIÁRIO Nº 1691

DIAS TRABALHADOS
 PRAZO CONTRATUAL (DIAS)

OBRA: COQUILHAS DO SNI - (7 9/21)

CLIMA/TEMPO

TEMPO		CONDIÇÃO			
Manhã:	Claro <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado <input type="checkbox"/>	Chuvoso <input type="checkbox"/>	Praticável <input checked="" type="checkbox"/>	Inpraticável <input type="checkbox"/>
Tarde:	Claro <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado <input type="checkbox"/>	Chuvoso <input type="checkbox"/>	Praticável <input checked="" type="checkbox"/>	Inpraticável <input type="checkbox"/>
Noite:	Claro <input type="checkbox"/>	Nublado <input type="checkbox"/>	Chuvoso <input type="checkbox"/>	Praticável <input type="checkbox"/>	Inpraticável <input type="checkbox"/>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA

LOCAÇÃO DE OBRA	<input type="checkbox"/>	MONTAGEM DAS FORMAS	<input type="checkbox"/>	CALCETEIRO	<input type="checkbox"/>
TERRAPLANAGEM	<input type="checkbox"/>	DOBRAGEM DAS FERRAGENS	<input type="checkbox"/>	SERVENTE	<input type="checkbox"/>
ESCAVAÇÃO DE VALAS	<input type="checkbox"/>	CONCRETAGEM	<input type="checkbox"/>	PEDREIRO	<input type="checkbox"/>
ATERRO/ REATERRO	<input type="checkbox"/>	LEVANT. DE PAREDES	<input type="checkbox"/>	MESTRE DE OBRA	<input type="checkbox"/>
ASSENTAMENTO DE TUBOS	<input type="checkbox"/>	CHAPISCO/REBOCO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
CONFEÇÃO CAIXAS PLUV.	<input type="checkbox"/>	PINTURA	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS	<input type="checkbox"/>	TELHAMENTO	<input type="checkbox"/>	EQUIPAMENTOS	<input type="checkbox"/>
PAVIMENTAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	<input type="checkbox"/>	RETRO ESCAVADEIRA	<input type="checkbox"/>
COMPACTAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	<input type="checkbox"/>	ESCAVADEIRA	<input type="checkbox"/>
SINALIZAÇÃO	<input type="checkbox"/>	ASSENTAMENTO DE PISOS	<input type="checkbox"/>	MOTONIVELADORA	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	ACABAMENTOS	<input type="checkbox"/>	CAMINHÃO BASCULANTE	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	ROLO COMPACTADOR	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	PLACA COMPACTADORA	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES: FUNCIONÁRIOS ISOLADOS

Assinatura Contratado

Assinatura Fiscalização/Supervisão

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

**Recibo de Transferência**

Número: 01187821168/00000000842660/720282

Data: 09/07/2021

Hora: 09:40:02

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/07/2021
Valor: R\$ 83801,27
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0170-04.018010.0-6
Nome do Remetente: MUNICIPIO DE COQUEIROS DO SUL
Conta do Destinatário: 0341-06.013761.0-0
Nome do Destinatário: CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME
Finalidade: PGTO FORNECEDOR

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F0C2D7000AA9673E566C8E2805D5DD5445

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200
